



仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025 (R7) . 5. 末




【 鉄筋工事 】

掘削工事完了後に、新庁舎の土台となる基礎工事を進めています。地下の床（マツスラブ）は厚さ3mもあり近くで見ると圧巻です。

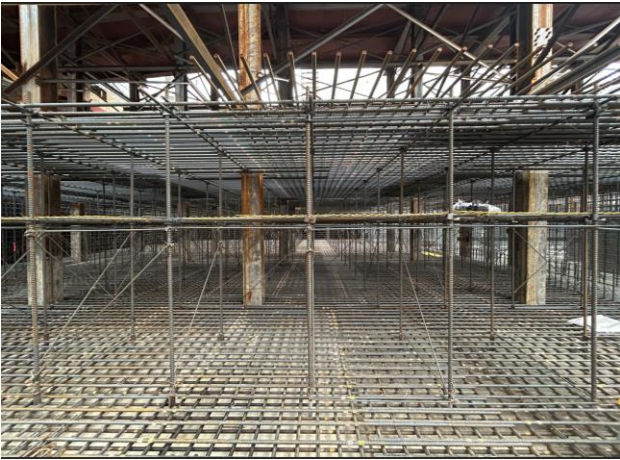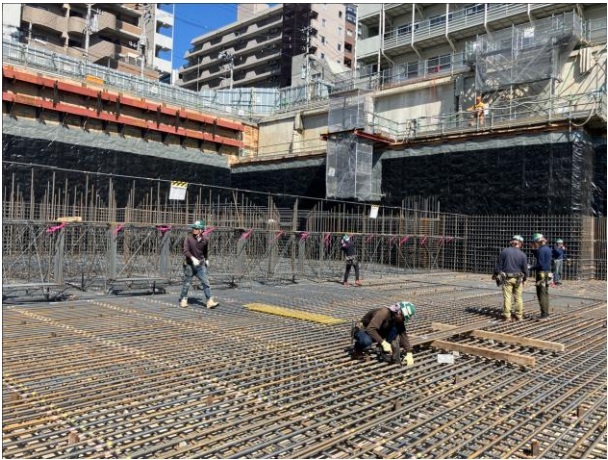

【 コンクリート打設 】

コンクリート打設工事が開始し、生コン車の往来が盛んになっています。5月後半から8月にかけては生コン車が1日あたり70台程度往来し、約300m3のコンクリート打設が日々行われます。

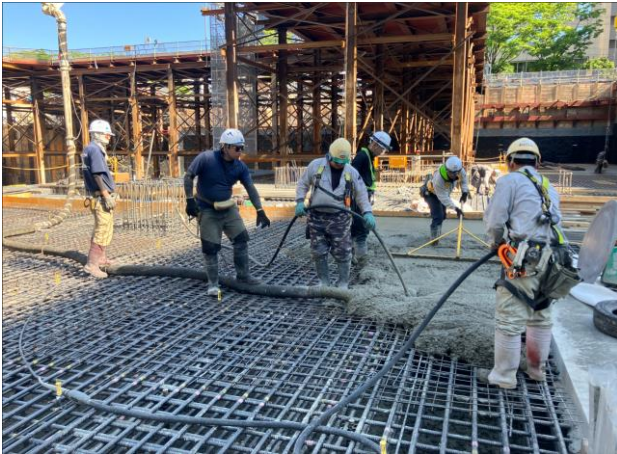

【 掘削工事 】

昨年11月から始まった掘削工事の終わりが見えてきました。6月末完了に向けて引き続き安全に作業を進めていきます。

