


仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025 (R7) . 7. 末

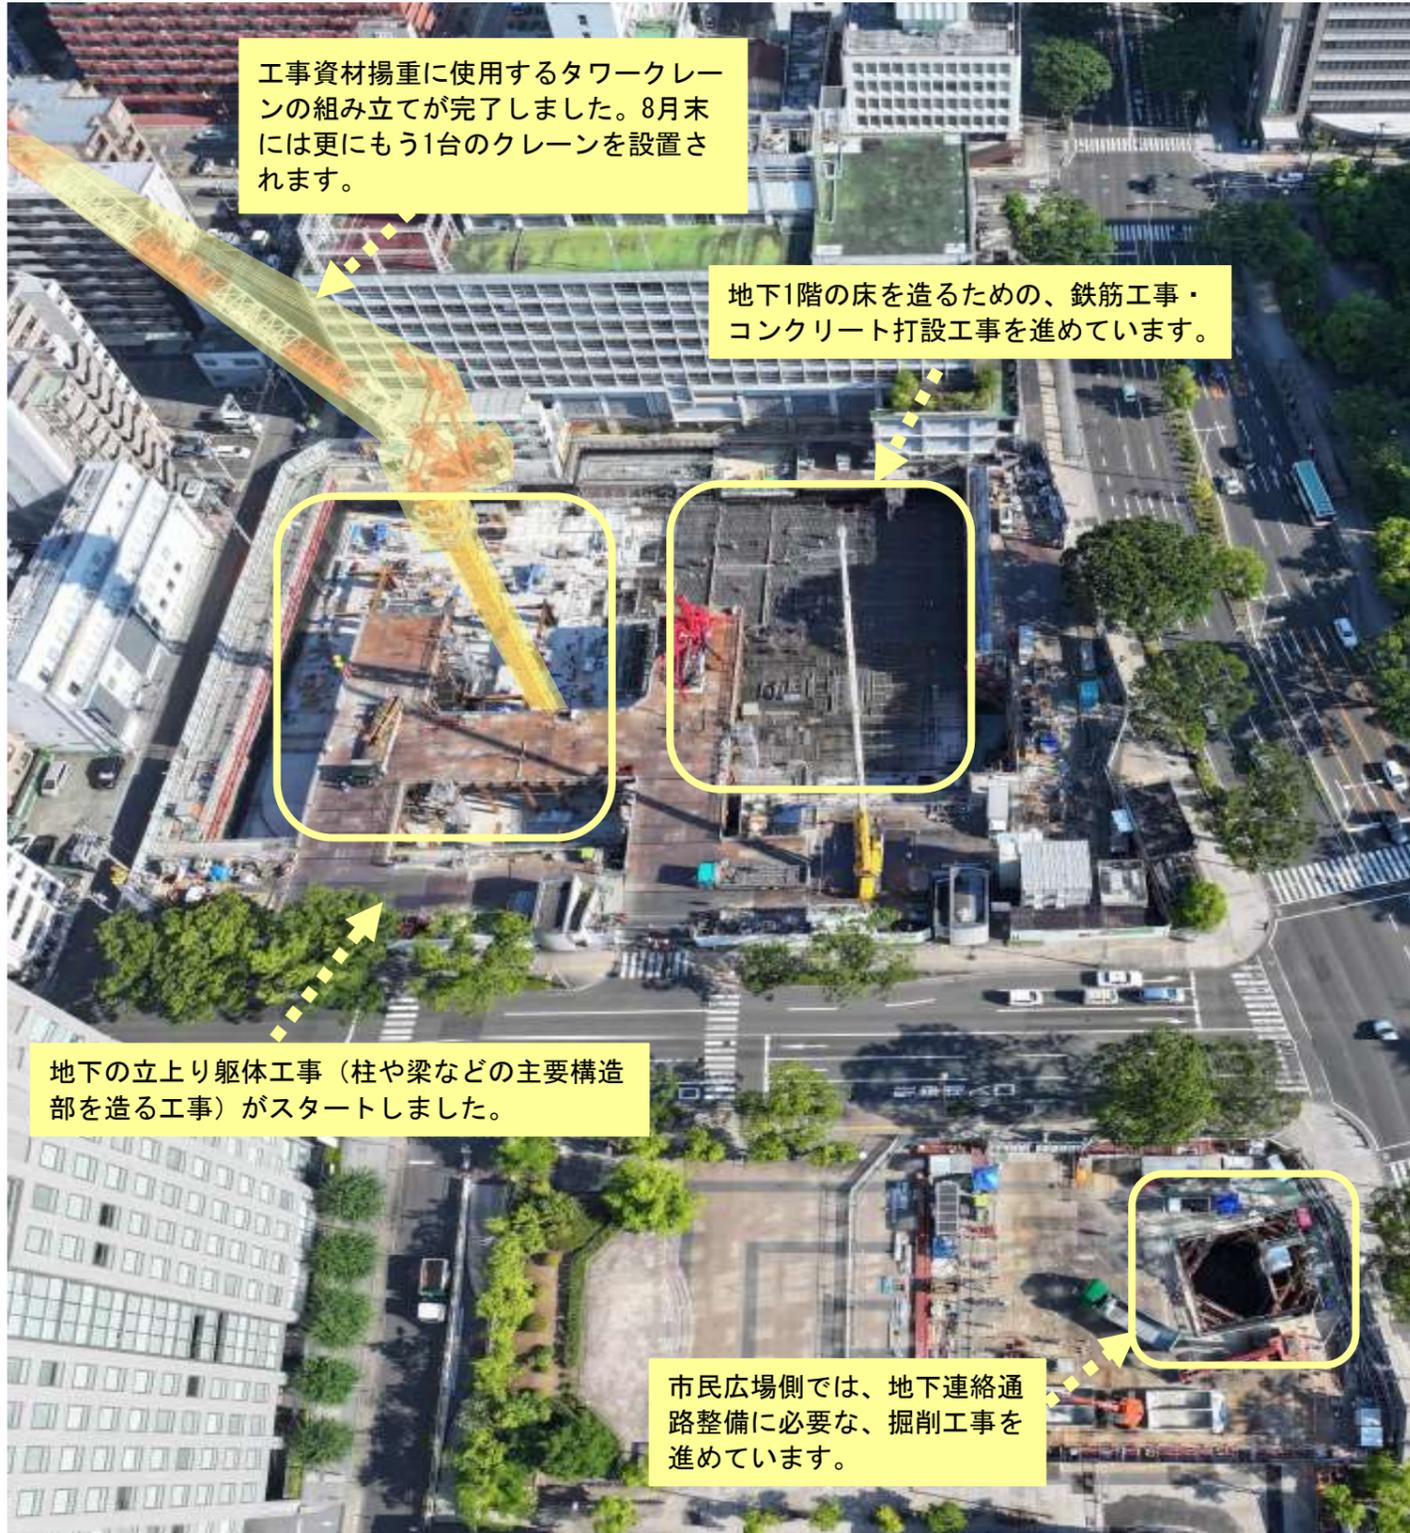

【 タワークレーン組み立て工事 】

7月は現場の資材揚重に使用するタワークレーンの組み立て作業を進めました。最大で25tも吊ることができる頼もしい存在です。8月末にはもう1台設置されます。



(タワークレーン組み立ての様子)

【 地下連絡通路工事を進めています 】

地下通路工事が本格的に進んでいます。ハイプクラムという特殊な装備を付けた重機を使用して、真下に向かって深さ15mの穴を掘っています。掘る穴の大きさは約11m×11mで、奈良の大仏がちょうど納まる程の大きな穴です。秋からはいよいよ道路下で「推進機」による地下通路を作るための掘削を進めていきます。

