

皆様には、日ごろ公共事業にご協力とご理解をいただき、心より感謝申し上げます。

《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

《進捗状況》

昨年より掘削工に着手し 現在、工事は93%程度完了しています。残土の搬出作業は完了し、残りは舗装と流末の排水工事です。

進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.3.10



進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.6.18



法面保護
が完了し
ました。



進捗写真 【南から北側を撮影】



進捗写真 【北から南側を撮影】

《お知らせ》

工事期間延長について

排水構造物の流末排水計画の変更に伴い、令和2年8月末まで工事期間を延長致します。

夏季休暇時の工事休止について

令和2年8月9日～令和2年8月16日（夏季休暇 8日間）は休工の予定となります。

《工事の順序》

下図の『 』の掘削は完了し、残りは舗装と流末の排水工事です。


進捗状況・予定

掘削・法面保護完了

残工事：舗装



流末排水計画

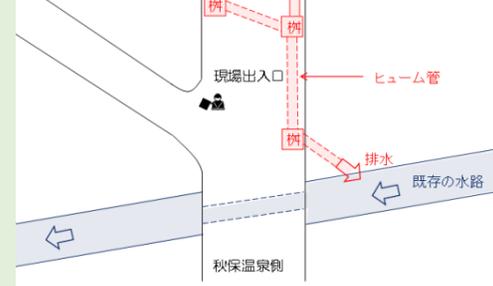

残工事の予定

	6月	7月	8月
法面保護作業	—		
側溝設置作業	—		
流末排水作業	—	—	
舗装作業			—

流末排水計画箇所



《工事中の道路規制》

7月・8月の施工範囲（昼間は交通誘導員が規制対応）

夜間信号による規制範囲(これまでと同じ規制区間です。)



地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽に相談いただくと幸いです。

お問い合わせ先：深松組 022-393-6571

現場代理人 相澤 070-2011-1166

監理技術者 田村 080-5744-9117

『道路工事だより』は2ヶ月毎に予定しています。
