

都市計画道路 宮沢根白石線（舟丁工区） 工事のお知らせ

地域の皆様には、日ごろより仙台市の行政運営にご理解、ご協力を頂き心より感謝申し上げます。
宮沢根白石線（舟丁工区）七郷堀水路改築工事は10月下旬より現場着手致しました。現在は、七郷堀左岸部の取壊しと迂回路の造成を行っています。
迂回路供切替後、七郷堀の右岸部の掘削を行い、ボックスカルバート1、2ブロックのコンクリート打設に向けて、作業を進めていきます。作業の進捗状況によっては工事車両が頻繁に進入することもあり、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、誘導員の配置等を行い、安全に配慮しながら施工を致します。
工事のお問い合わせ・お気づきの点がございましたらお手数ですが、下記連絡先までご連絡をお願いします。

作業状況


バックホウにアタッチメントを取付け、取壊しを行っています。

①掘削状況

左岸部の取壊しを開始しました。迂回路造成が完了次第、右岸部の取壊しに着手します。



今後の作業内容

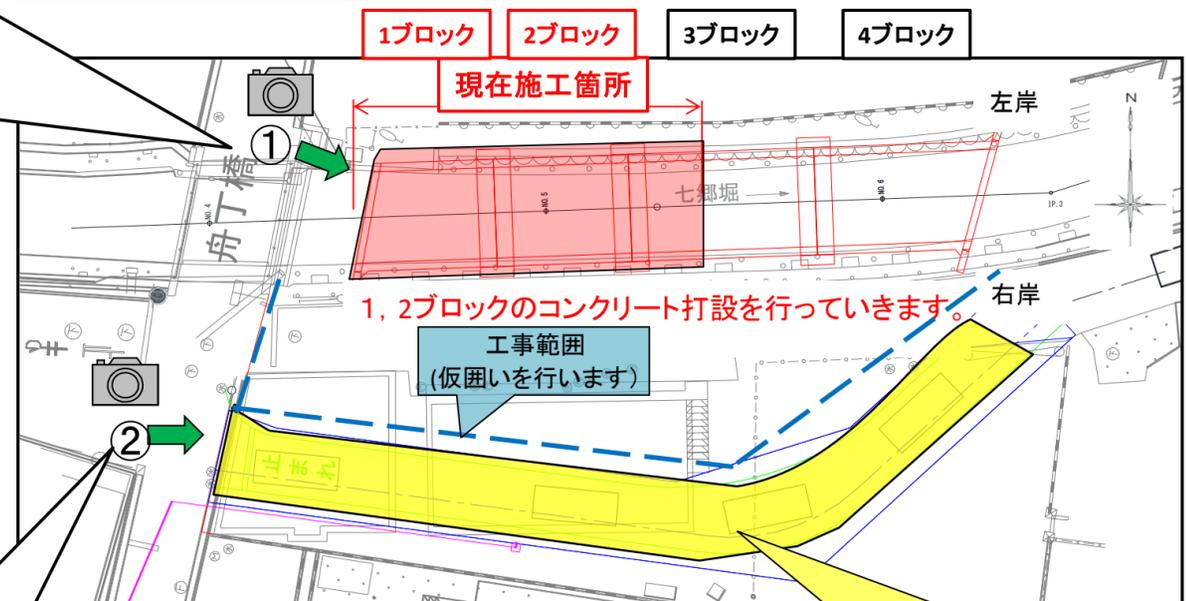

**迂回路
11/23(金) 10時~切替開始**

②迂回路造成状況

迂回路の造成をしています。現在は迂回路の位置出しを行っています。
11月23日(金)10時より迂回路へ切替る予定です。



工程表

工種・内容	12月	1月	2月	3月	4月	5月	備考
カルバート工 土工			1~2ブロック埋戻 3~4ブロック掘削		3~4ブロック埋戻		
カルバート工 本体	1~2ブロック		3~4ブロック				工事完了
構造物撤去工・復旧工							

お問い合わせ先

発注者	仙台市建設局南道路建設課 道路第一係	受注者	サイト工業株式会社
担当	齊藤龍也 成田幸久	担当	高橋誠
電話番号	022-214-8378	電話番号	022-355-8123
