

# 歩道設置工事のお知らせ

皆様には、日頃より公共工事にご協力頂き誠に有難うございます。

右の位置図の箇所において道路を拡幅し歩道設置する工事を行っており、7月をもちまして水路補修工事が完了しました。

歩道の拡幅工事につきましては、想定よりも地盤が弱く当初計画していた擁壁の施工が困難となり、現在工法の見直しを行っております。工法見直し後の現場着手は10月頃を予定しております。


また、工法の見直しに伴い工期を令和6年3月29日まで延期します。工事中は振動騒音等ご不便ご迷惑をお掛けするかと存じますが、安全作業にて工事を行いますので、ご協力下さいますようお願い致します。

なお、工事に伴い一部片側交互通行での道路を行う場合がありますので地域住民の方々にはご不便をおかけしますが上記と重ねてご協力をお願い致します。


位置図



施工箇所詳細図

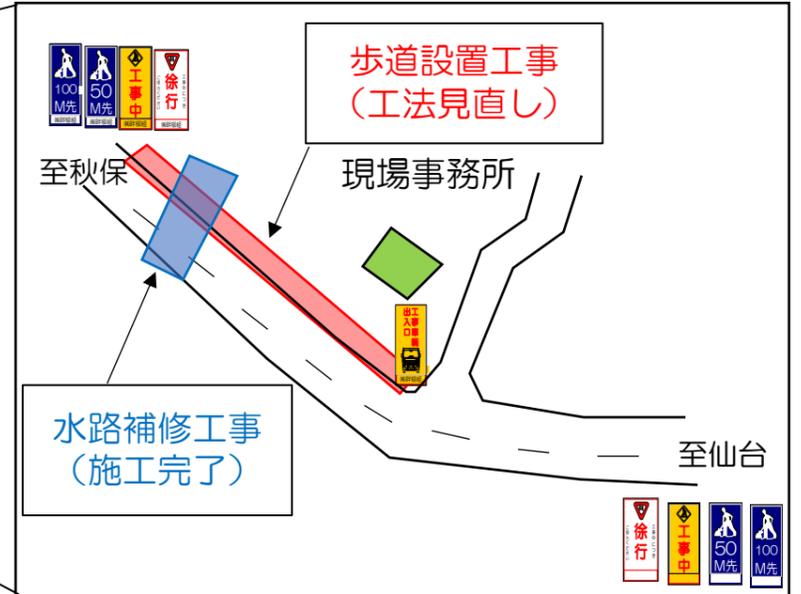

水路補修工事完了写真

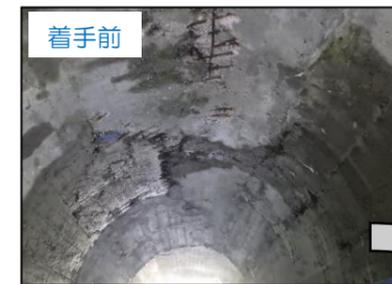


表面のコンクリートが剥がれ鉄筋が露出している状況でした。



鉄筋は防サビ処理をし、特殊なモルタルで修復しました。

- 工 事 名 : (主) 仙台山寺線(舟木南) 歩道設置工事(その3)
- 施 工 場 所 : 仙台市太白区茂庭字舟木南地内
- 施 工 工 期 : 令和5年3月8日~令和6年3月29日(工期延期)  
※ 休工日は、土日祝祭日となりますが、作業進捗や悪天候等により、変更となる場合がありますのでご了承ください。
- 作 業 時 間 : 午前 8:00 ~ 午後 17:30まで
- 交 通 規 制 : 片側交互通行(道路規制がある場合)  
午前 9:00 ~ 午後 5:00まで
- 工 事 内 容 : 歩道設置工事・水路補修工事
- 発 注 者 : 仙台市長 郡 和子
- 担 当 部 署 : 仙台市建設局道路部南道路建設課道路第二係  
担当 木村 静輝 鷲 広輝  
TEL 022-214-8409
- 施 工 業 者 : 金福建設 株式会社(キンブクケンセツ)  
工事担当者 増田 裕  
会社 TEL 022-234-0519

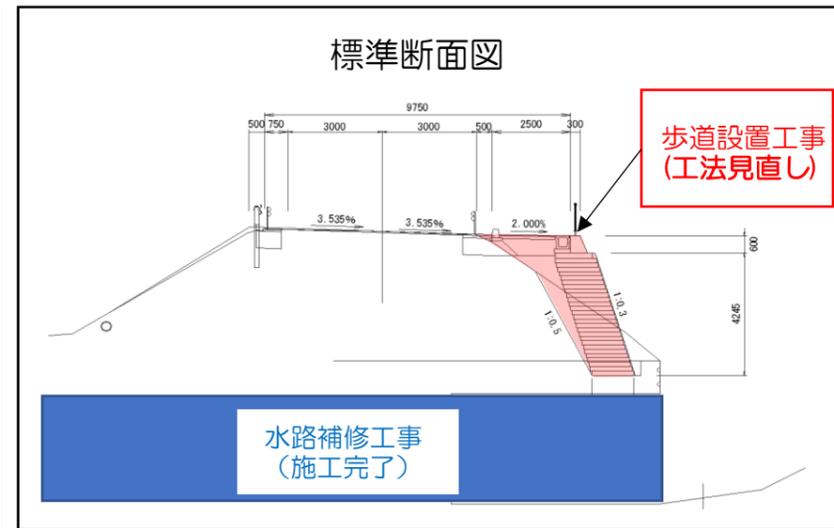

工事工程表

工 種	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	■											
水路補修工	■	■	■	■	■							
擁壁工(工法見直し中)					■	■	■	■	■	■		
側溝工										■		
縁石工											■	
防護柵工												■
舗装工												■
片付け												■

