

工事のお知らせ


(主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
11月から12月末までは、掘削・排水・法面吹付工事を行ってまいりました。
令和3年1月からも引き続き、掘削工事が主な作業となりますが、その他、小段毎の排水工事、法面吹付工事及び法枠工事も随時行う予定です。
工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くださいますよう、お願い致します。

●工事期間の延長について

工事期間について、令和3年3月末までとしておりましたが、夏季の悪天候や地盤の状況等により、**令和3年7月末まで延期する予定となりました。**地域住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き安全に十分配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

位置図

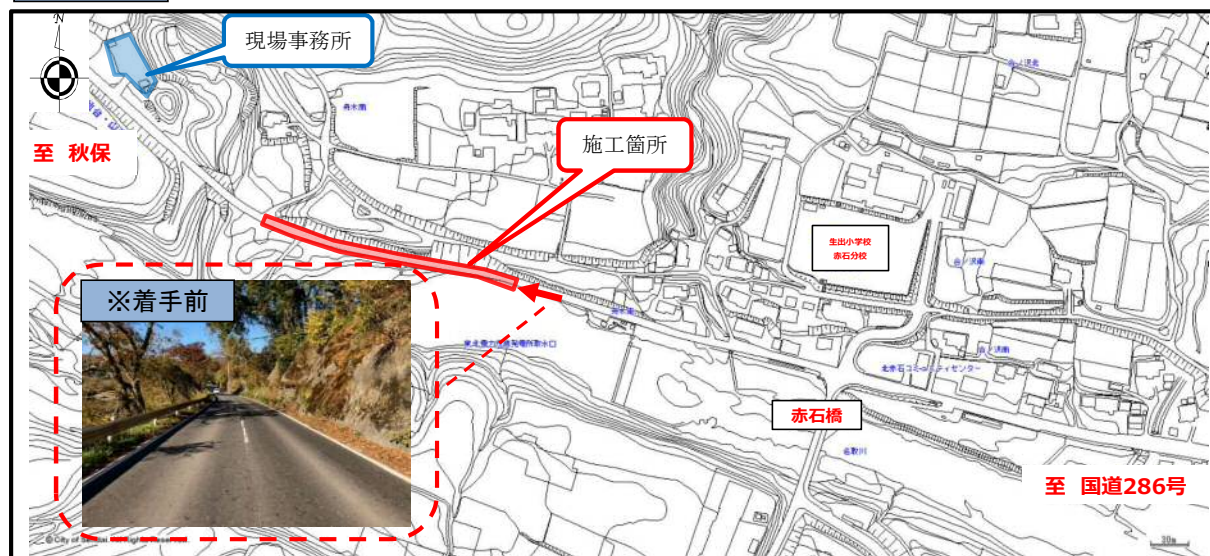


工程表

工種	工事期間の延長													
	R2,6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3,1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
伐採工	■													
掘削工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
吹付工・法枠工							■	■	■	■				
排水構造物工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
切土防護柵撤去工												■	■	■
舗装工													■	■
片付け														■

工事に関するお問い合わせ先
 ◎施工者 株式会社 高工
 現場代理人：櫻井 敏矢
 連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)

事業に関するお問い合わせ先
 ◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：浅野 真志
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)

令和2年 11月・12月 工事内容

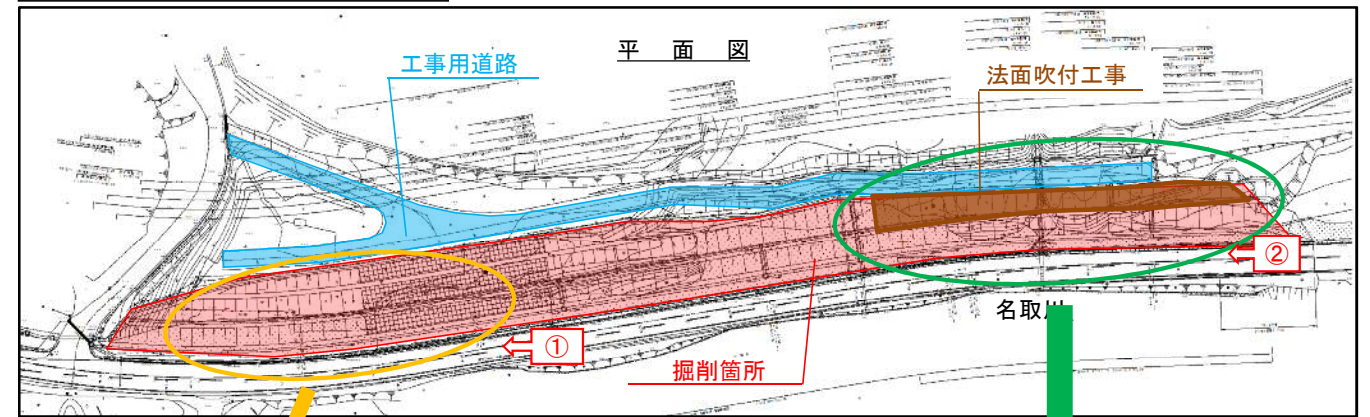

1. 掘削工事 ※上平面図①

※掘削施工中(小段2~小段1)



2. 法面工事 ※上平面図②


※法面吹付施工中(小段2)



令和3年 1月・2月 工事内容

引き続き掘削工事・排水溝設置工事・法面吹付工事を行ってまいります。
 加えて、法枠工事も行ってまいります。(下図参照)

※平面図 法枠工事施工予定箇所(現地調査の結果により範囲が変更となりました。)

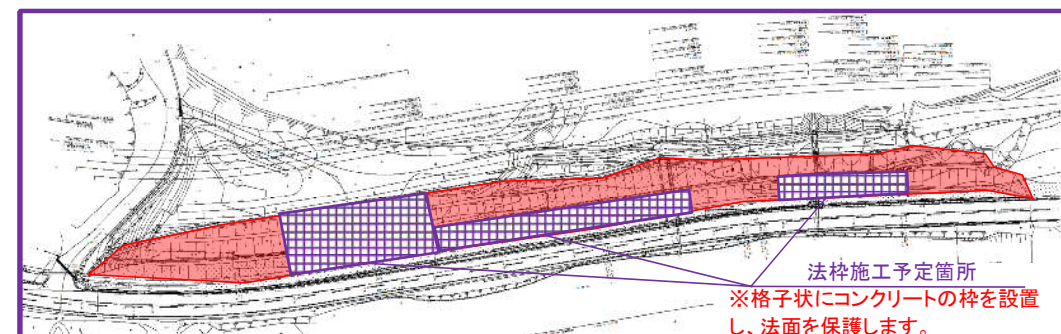

※法枠イメージ写真



切土落石防護柵完了

