

宮沢根白石線(南鍛冶町工区) 工事だより



『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより(第7号)』の発刊にあたって

地域の皆様には、日ごろより仙台市の行政運営にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。先行して行っているその3工事ですが、現在、橋面工の作業を行っております。5月に架設した橋桁の間に、コンクリートを流し込み、独立していた橋桁を一体化させる作業を行いました。


その4工事については、工場で製作していた橋桁を6月12日からの4日間と7月9日からの8日間の2回に分けて亘理町の工場から現場まで運搬し、主桁63本の架設を行いました。橋桁架設作業中は、大型車の出入りが多くなってしまい、ご迷惑をお掛けしました。地域のみなさまのご協力、ご理解があり、無事本工事の主桁架設を完了させることができました。なお、気になる点、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

工事の予定

日程	平成30年3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
工事予定内容(その3)	現場内整地			主桁架設			主桁架設			主桁架設			橋面工			橋面工			橋面工			橋面工			橋面工			橋面工			橋面工					
大型特殊車両通行予定日(その3)																																				
工事予定内容(その4)	現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地			現場内整地		
大型特殊車両通行予定日(その4)																																				

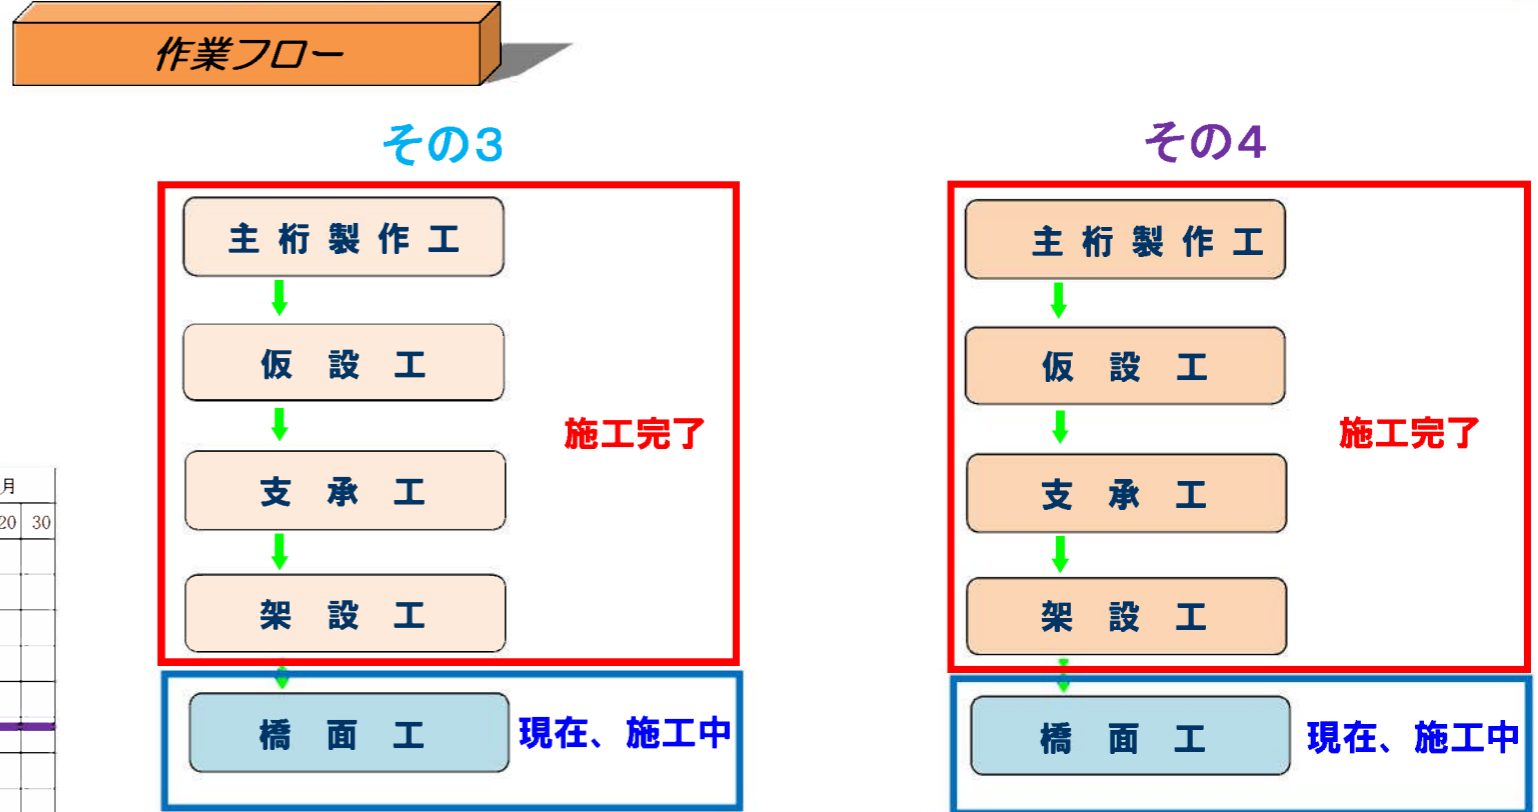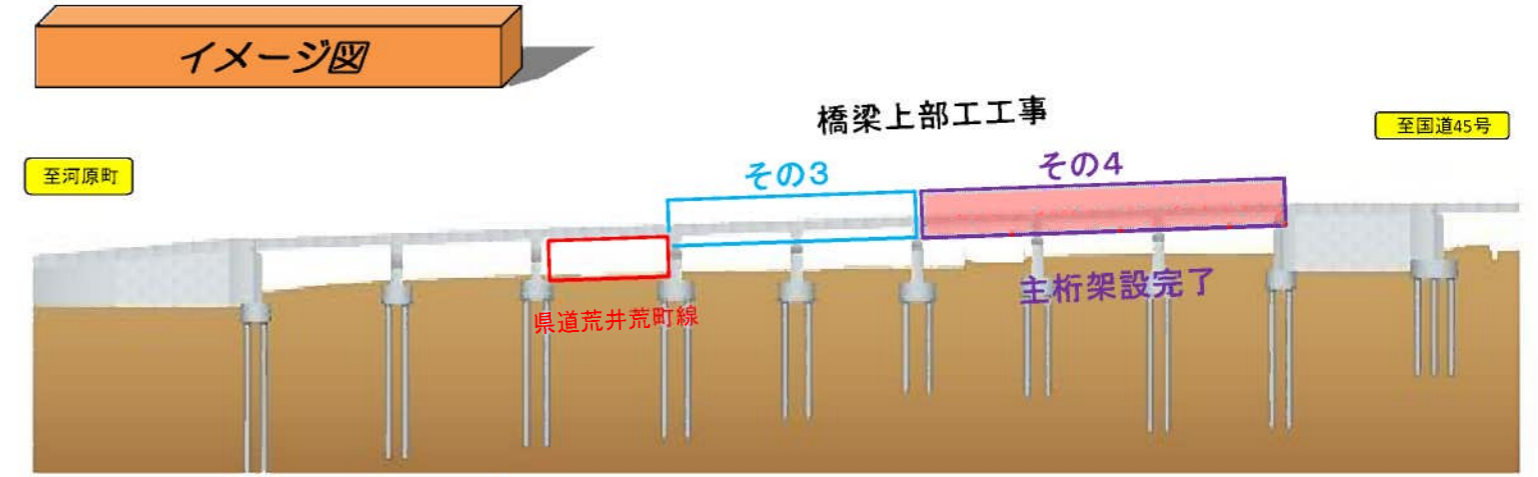

その4工事主桁架設完了(県道荒井荒町線沿いから撮影)

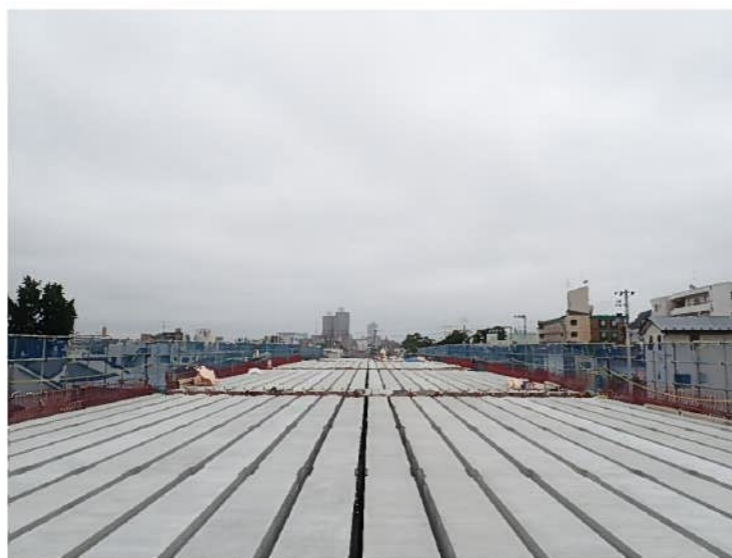

その4工事主桁架設完了(橋面上から撮影)



橋桁の間にコンクリートを流し込んでいる状況です。



橋桁を架設している状況です。

お問い合わせ先

発注者
 仙台市建設局道路部南道路建設課道路第一係
 担当 齊藤 龍也(さいとう たつや)
 成田 幸久(なりた ゆきひさ)
 高瀬 朝子(たかせ あさこ)
 TEL 022-214-8378

上部工工事の施工業者

請負者 東日本コンクリート株式会社
 その3工事担当 栗原 悠(くりはら ゆう)
 その4工事担当 畠山 慎吾(はたけやま しんご)
 TEL 022-226-8028

