

# R6社会実験(案)の概要

---

## (交通WG)

# 概要

## ① R6社会実験の趣旨(交通WG)

**利活用空間創出と歩行環境向上**  
**2車線化・自転車空間設置案をベースに検討**  **道路空間再整備時の  
交通状況の確認のための社会実験**



# 概要

## ② 基本計画までの流れ

### 課題等

- ・歩行者、自転車、自動車等の安全な動線分離
- ・交通渋滞の抑制
- ・バス・タクシー乗降所や荷捌きスペースの確保  
など
- ・路上駐車車両の抑制

R6社会実験:ベース案の課題等の検証

課題に対する運用状況の評価  
課題の掘り起こし

R7社会実験:交通状況改善等の再検証


基本計画:道路空間の再整備方針

# 概要

## ③ 日程(案)


- 準備 : 実験開始日前日22時から ※完了次第規制開始
- 実験 : 11月中旬~12月上旬 金・土・日 2~3日程度
- 撤去 : 実験最終日22時から

## ④ 実験範囲

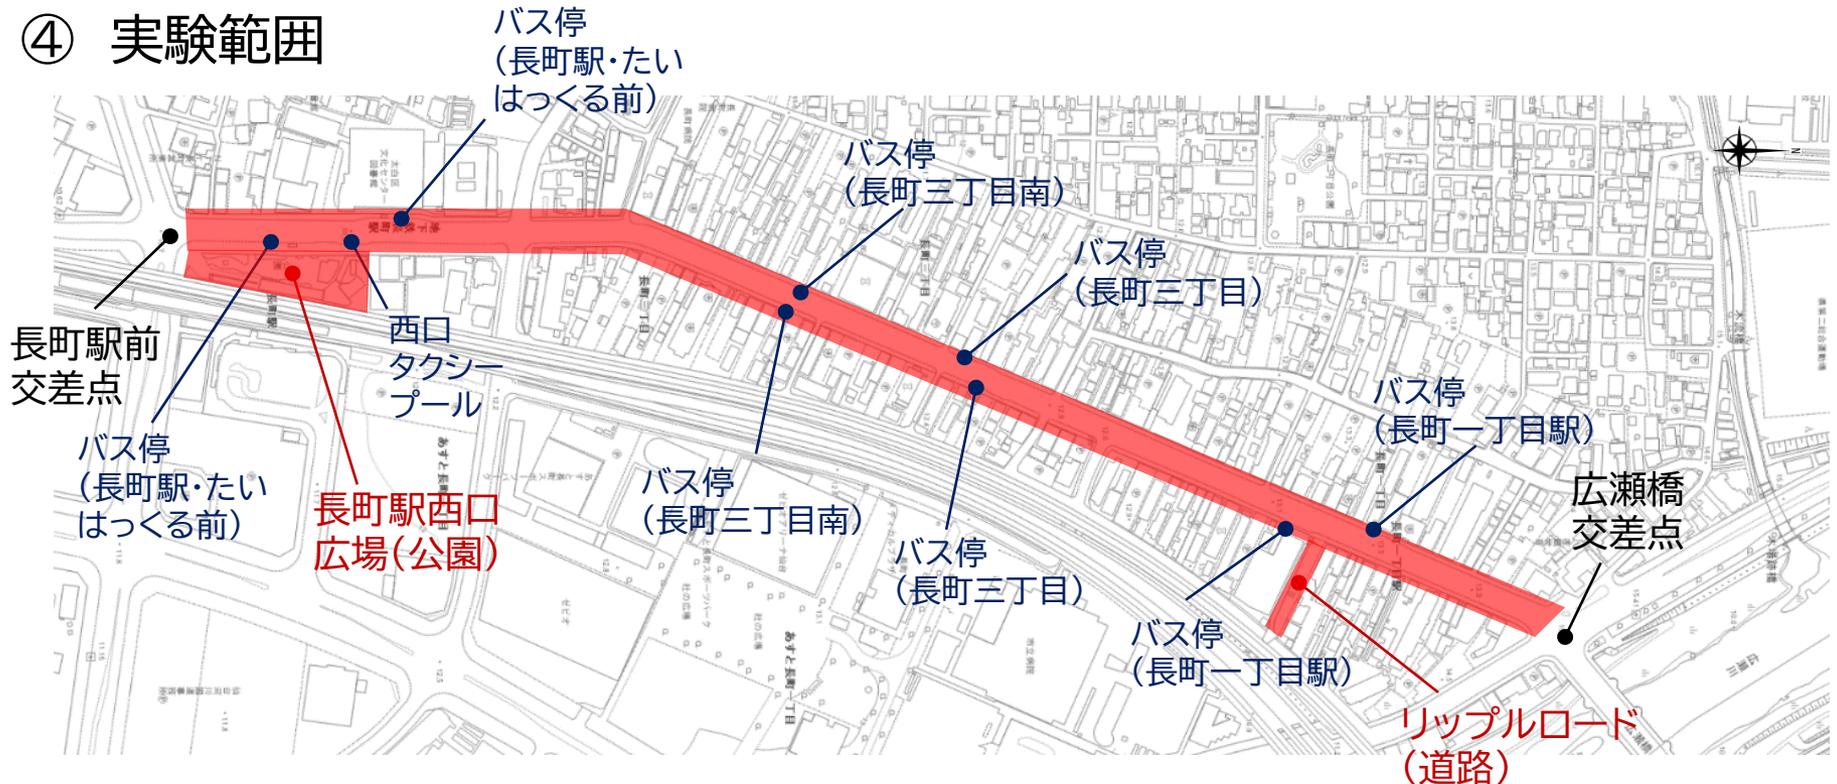

# 概要


## ⑤ 断面図(標準部)

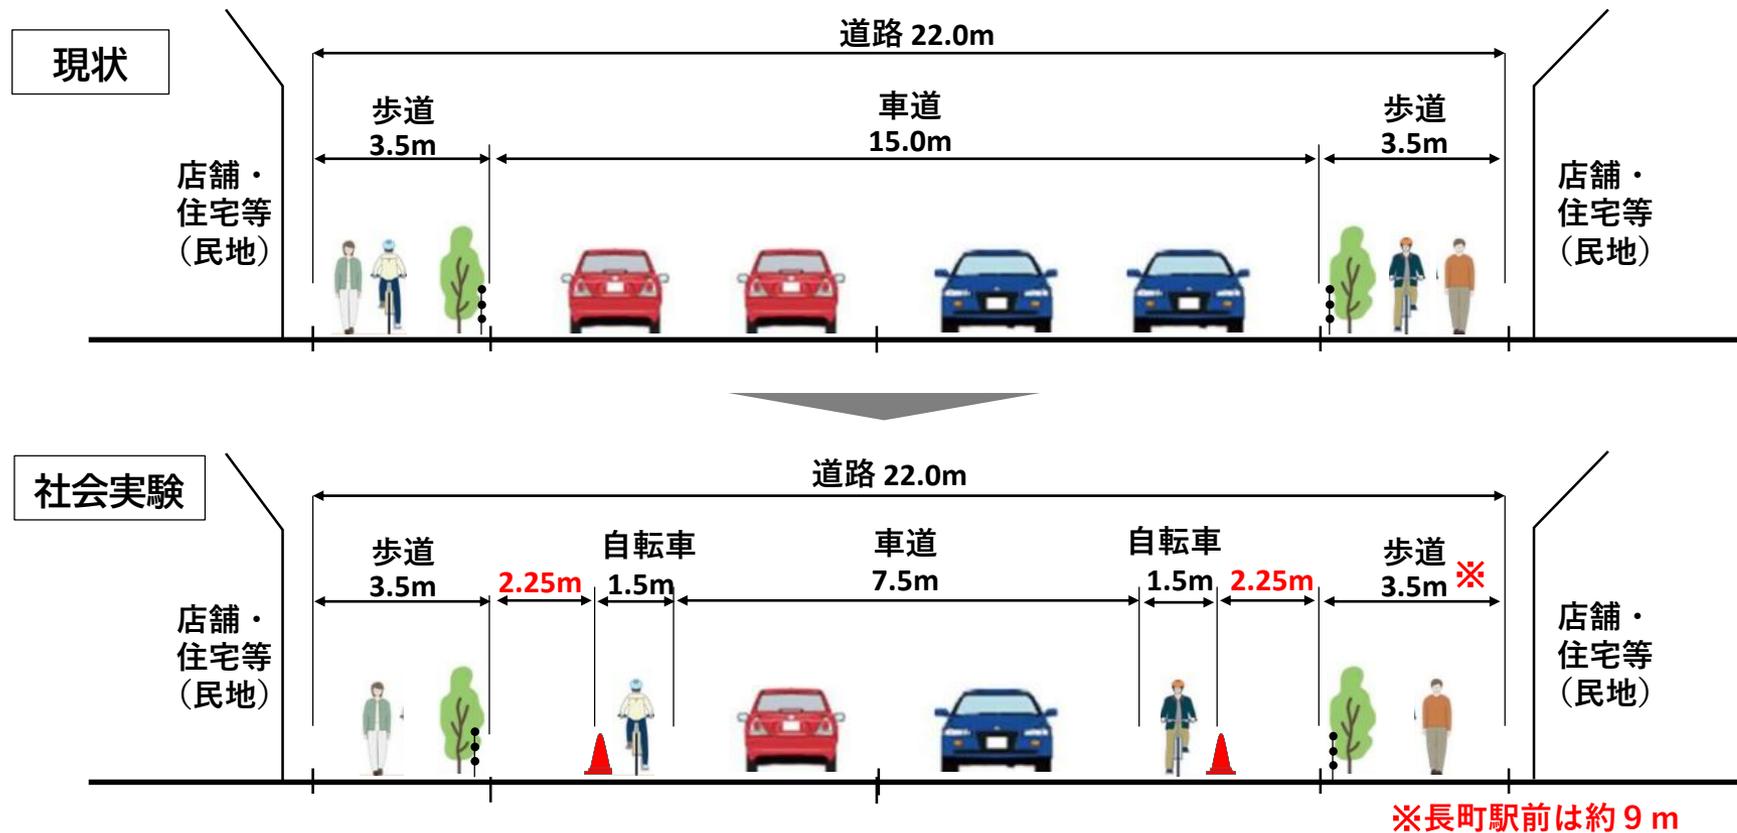

- ※車道は現状の区画線の変更は行わず、中央の2車線を走行空間とする。
- ※交差点部の右折レーンは現状のままとする。
- ※歩道上にある植栽や地上器、ガードパイプ等の移設は行わない。
- ※バス停・タクシープール部分は現状のままとする(歩道幅は減少)。

# 概要

## ⑥ 平面図(例)

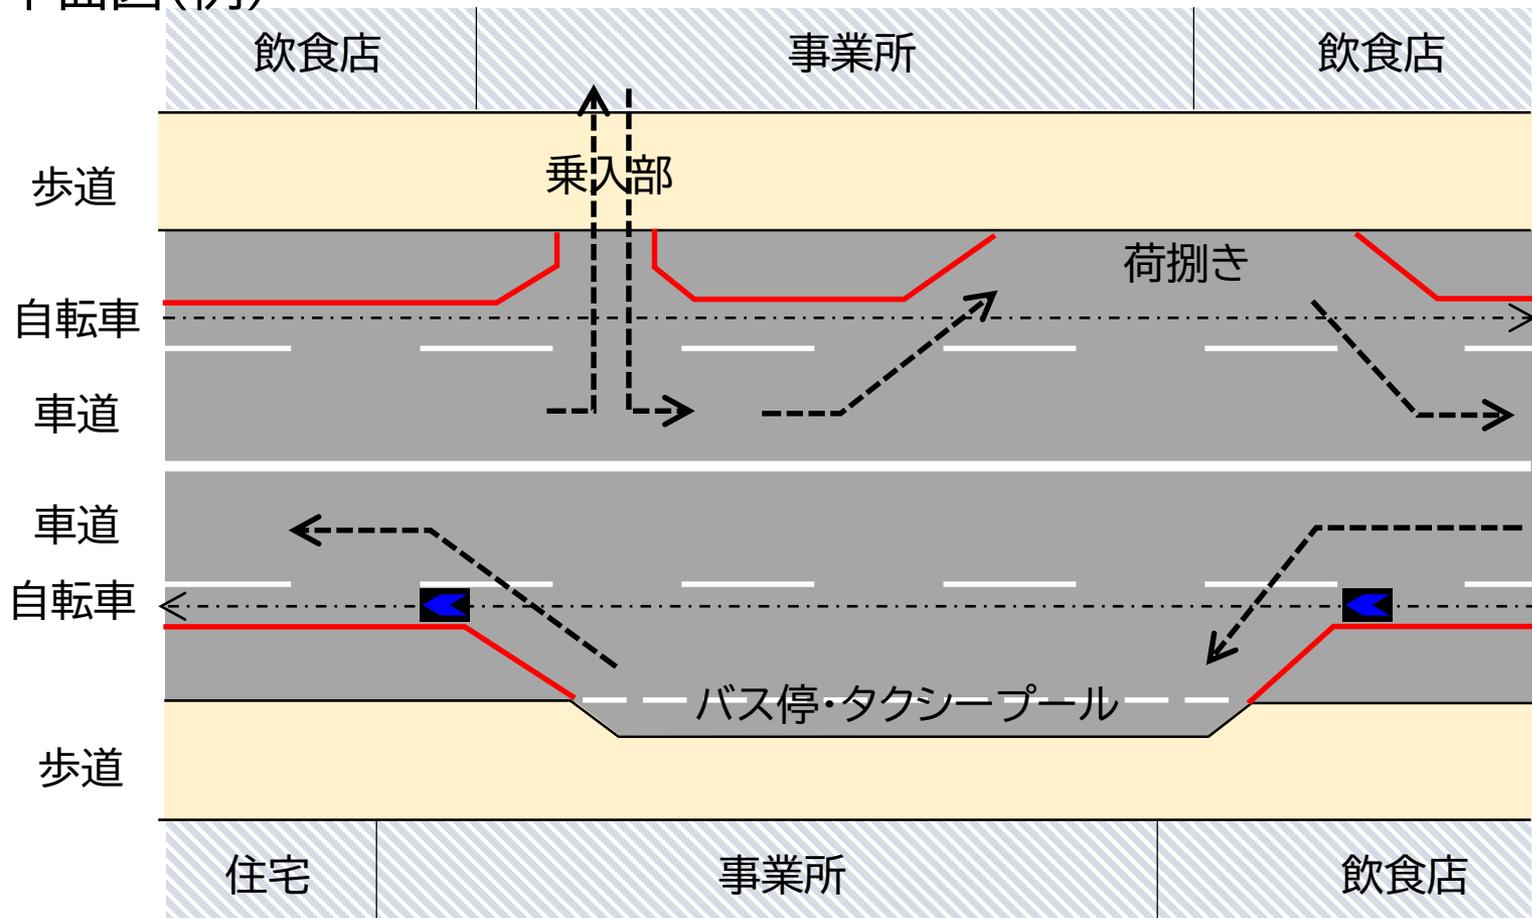

— 車道規制箇所(カラーコーン)      - - - - > 車両の動線      ·····> 自転車の動線

- ※24時間上記の規制を行うこととし、時間帯による運用の変更は行わない。
- ※警備員・誘導員は適宜配置し、規制材の点検・補修等も行う。
- ※荷捌きスペース等には案内看板を設置し、周知に努める。

# 検証・調査内容(交通)

※下記は現時点での想定。

## 検証内容

- ・歩行者、自転車、自動車等の安全な動線分離
  - ・歩行者の安全性
  - ・自転車の交通量・走行状況
  - ・自転車が沿道店舗に立ち寄る際の歩行者との錯綜
  - ・バスと自転車が交差する部分の安全性
  - ・自転車通行帯部分の駐車車両の発生状況
  - ・荷捌き箇所の妥当性(箇所数・位置)
  - ・荷捌きの安全性
- など

## 検証内容

- ・本路線の交通量の変化  
(事前と事後、実験開始と終了)
  - ・交通渋滞の発生状況
  - ・周辺道路の交通容量の把握
- など

※R6社会実験については、事前にできる限りの周知等を行うが、実験期間が短期間であること等を踏まえると交通量は安定しないと考えられるため、交通渋滞の状況等についてはR7社会実験(長期間)も踏まえて評価していく。

## 調査内容

### カメラ調査

- 調査日 : 社会実験前の平日・休日  
社会実験中の平日・休日
- 時間 : 12時間
- 調査概要 : 照明灯などに定点カメラ  
(2か所程度)を設置
- 分析 : 録画した映像データより  
目視で確認

## 調査内容

### 交差点交通量調査

- 調査日 : 社会実験前の平日・休日  
社会実験中の平日・休日
- 時間 : 12時間
- 調査概要 : 人によるカウント調査  
信号現示調査や渋滞長等の  
計測も行う
- 分析 : 交差点解析により、交差点  
改良の必要性を確認

# [参考]確認・調査内容(利活用)

※下記は現時点での想定。

## 確認内容

- ・人流の回遊性の変化
- ・滞在者・通行者の行動特性
- ・滞在時間の調査
- ・歩行者・自転車の交通量

など

## 調査内容

### 人流調査

- 調査日 : 社会実験中の3日間  
(通常時はR5に調査済み)
- 調査概要 : 歩行者・自転車交通量を調査、来訪者の属性情報による移動・滞留特性を調査
- 分析 : 上記データについて、ODマップを用いて移動・滞留特性を調査・分析

## 確認内容

- ・社会実験の取組み評価
- ・社会実験の認知方法
- ・社会実験時の来訪手段・目的
- ・自転車道設置による安全性の変化
- ・道路(周辺含む)の混雑による影響
- ・バス・タクシー乗り場の安全性
- ・来訪者の活動・行動の種類
- ・コンテンツの出店・参加理由

など

## 調査内容

### アンケート調査

- 調査日 : 社会実験中の3日間
- 調査概要 : 通行者・来訪者・出店者・沿道店舗等へのインタビュー又はアンケート用紙の配布(WEB)
- 分析 : アンケート結果を基に社会実験の有効性等を分析

# 社会実験のスケジュール

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
社会実験			内容検討			周知期間	実験	R6社会実験の検証		
				(内容確定)				R7社会実験の方針検討		
検討会	検討会				第2回					第3回
	利活用WG	第1回 ● (7/24)		第2回 ●				第3回・第4回		
	交通WG	第1回 ● (7/17)		第2回 ● (9/6)	第3回 ○			第4回・第5回		
(参考)市委託	調査業務		契約			事前調査	実験中調査	調査結果分析		
	安全関係業務		契約			周知看板	道路規制・警備			
	広報業務		契約		チラシ公表・配布					
